PROJEKTOWNIA

JOANNA JELENIEWSKA
ash2@poczta.onet.pl
tel.506080246

# PODSTAWOWE DEFINICJE

**CZYM SĄ :**

PROGRAM

PROJEKT

WNIOSEK

# PROGRAM

Program to grupa najczęściej ściśle połączonych ze sobą projektów, które wspólnie tworzą jedną całość i pozwalają osiągnąć wspólny cel nadrzędny, który nie byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby każdy z projektów był realizowany z osobna.

PROJEKTOWNIA

# PROGRAM- czyli gdzie szukać pieniędzy?

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, np.**
- UE : EFS, EFR,
- PROGRAMY RZĄDOWE
- KONKURSY GRANTOWE/ MAŁE GRANTY

**https://fundusze.ngo.pl/aktualne**

PROJEKTOWNIA

# ZATEM CO TO JEST PROJEKT ?

**Projekt to jednorazowe zadanie, które posiada określony termin rozpoczęcia i termin zakończenia, jasno określone cele, zakres działania i określony budżet.**

PROJEKTOWNIA

# PROJEKT TO.....

**metoda pracy,**
proces planistyczny, w który zaangażowany powinien zostać zespół projektowy
**Obejmuje:**
analizę sytuacji,
wyznaczenie celów,
działań,
rezultatów,
szacowanie zasobów niezbędnych do jego wykonania.

PROJEKTOWNIA

PROJEKTOWNIA

# cykl życia projektu

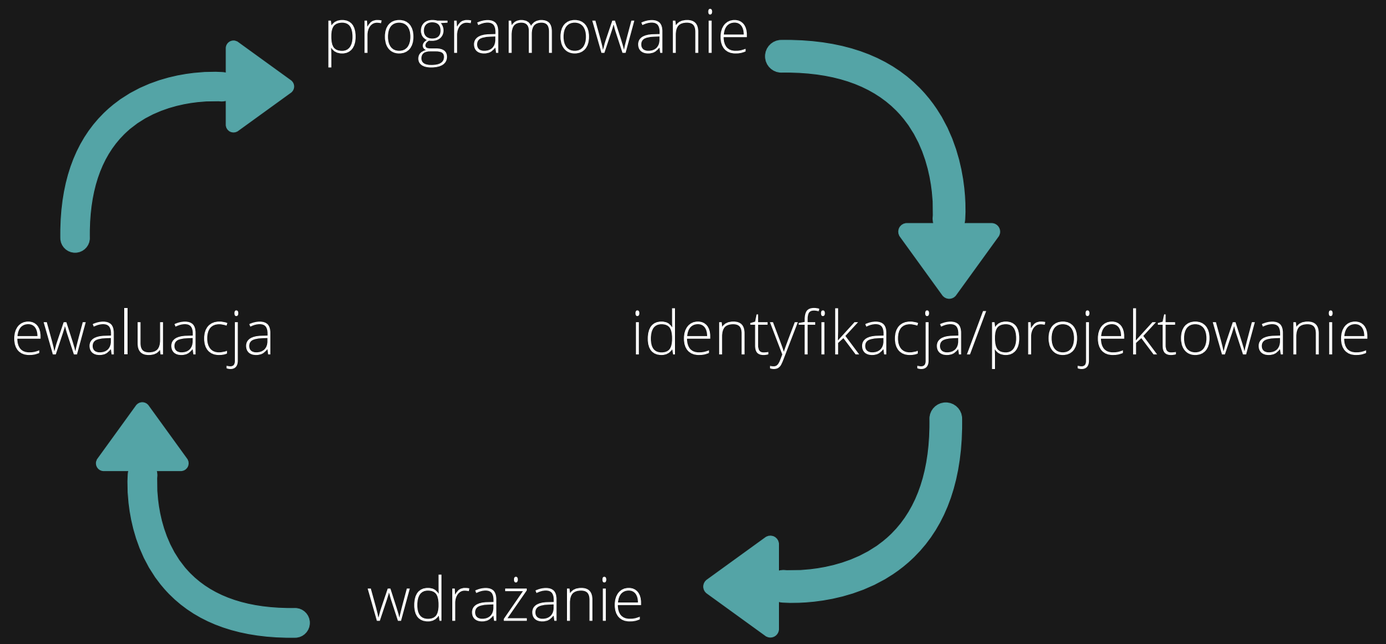

PROJEKTOWNIA

# MONITORING a EWALUACJA

| | |
|---|---|
| zbieranie informacji | badanie wybranych elementów projektu |
| wykonywany  w trakcie realizacji projektu | wykonywana jest po wybranym elemencie projektu lub po całościowej realizacji projektu |
| bada trzy elementy projektu: harmonogram działań, budżet oraz zaplanowane rezultaty | czy i jak udało nam się osiągnąć zamierzone cele oraz w jaki sposób udało nam się je osiągnąć |
| osoby zarządzające projektem | osoby odpowiedzialne za ewaluację to osoby zarządzające projektem  lub firma zewnętrzna |

# ELEMENTY PROJEKTU

# UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

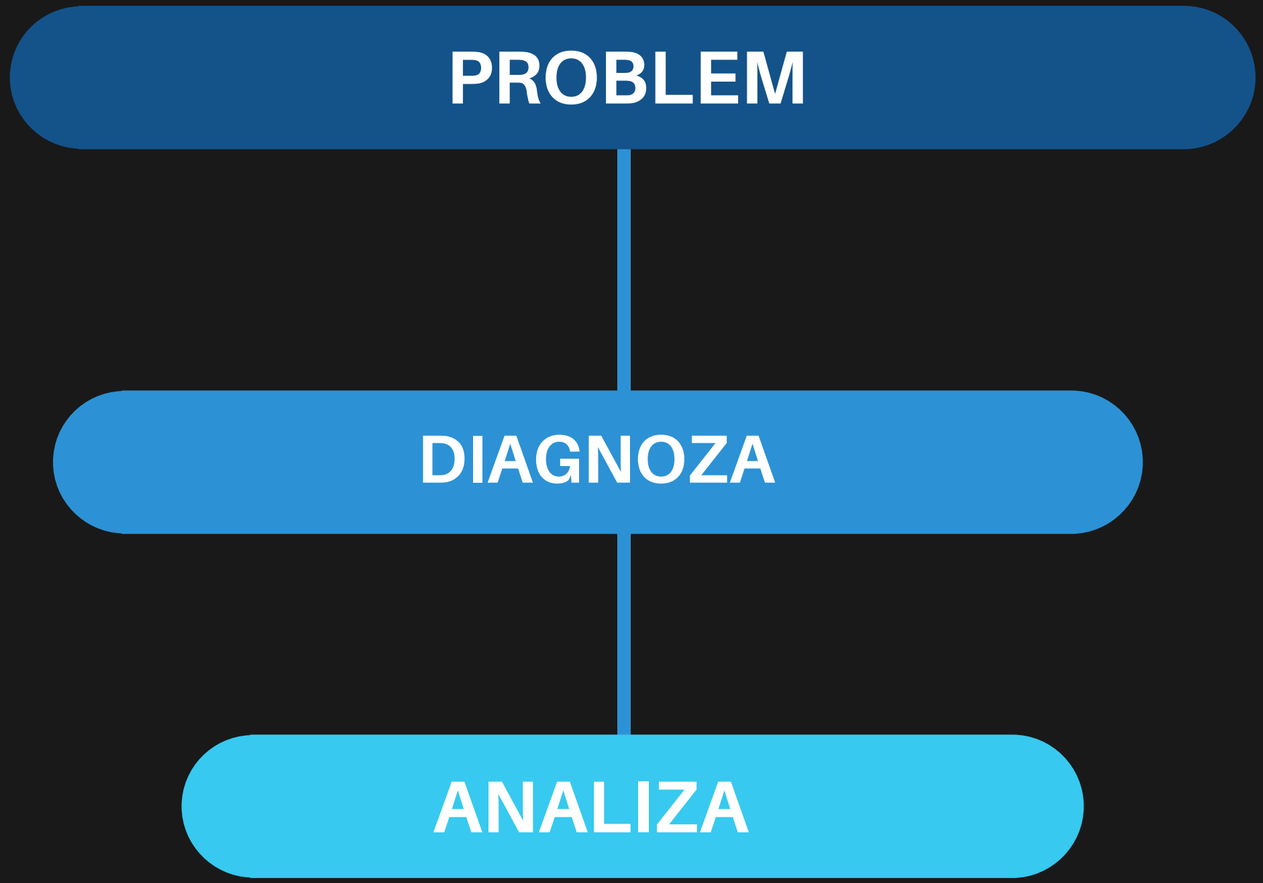

# DRZEWO PROBLEMÓW

# DIAGNOZA

Kogo/czego dotyczy problem?

Na jakim terenie występuje problem?

Jak problem zmienia się w czasie?

Jakie są jego przyczyny?

Co się stanie, jeśli problem nie zostanie rozwiązany? (skutki)

skąd wiemy o problemie ? (DANE LICZBOWE!!!!)

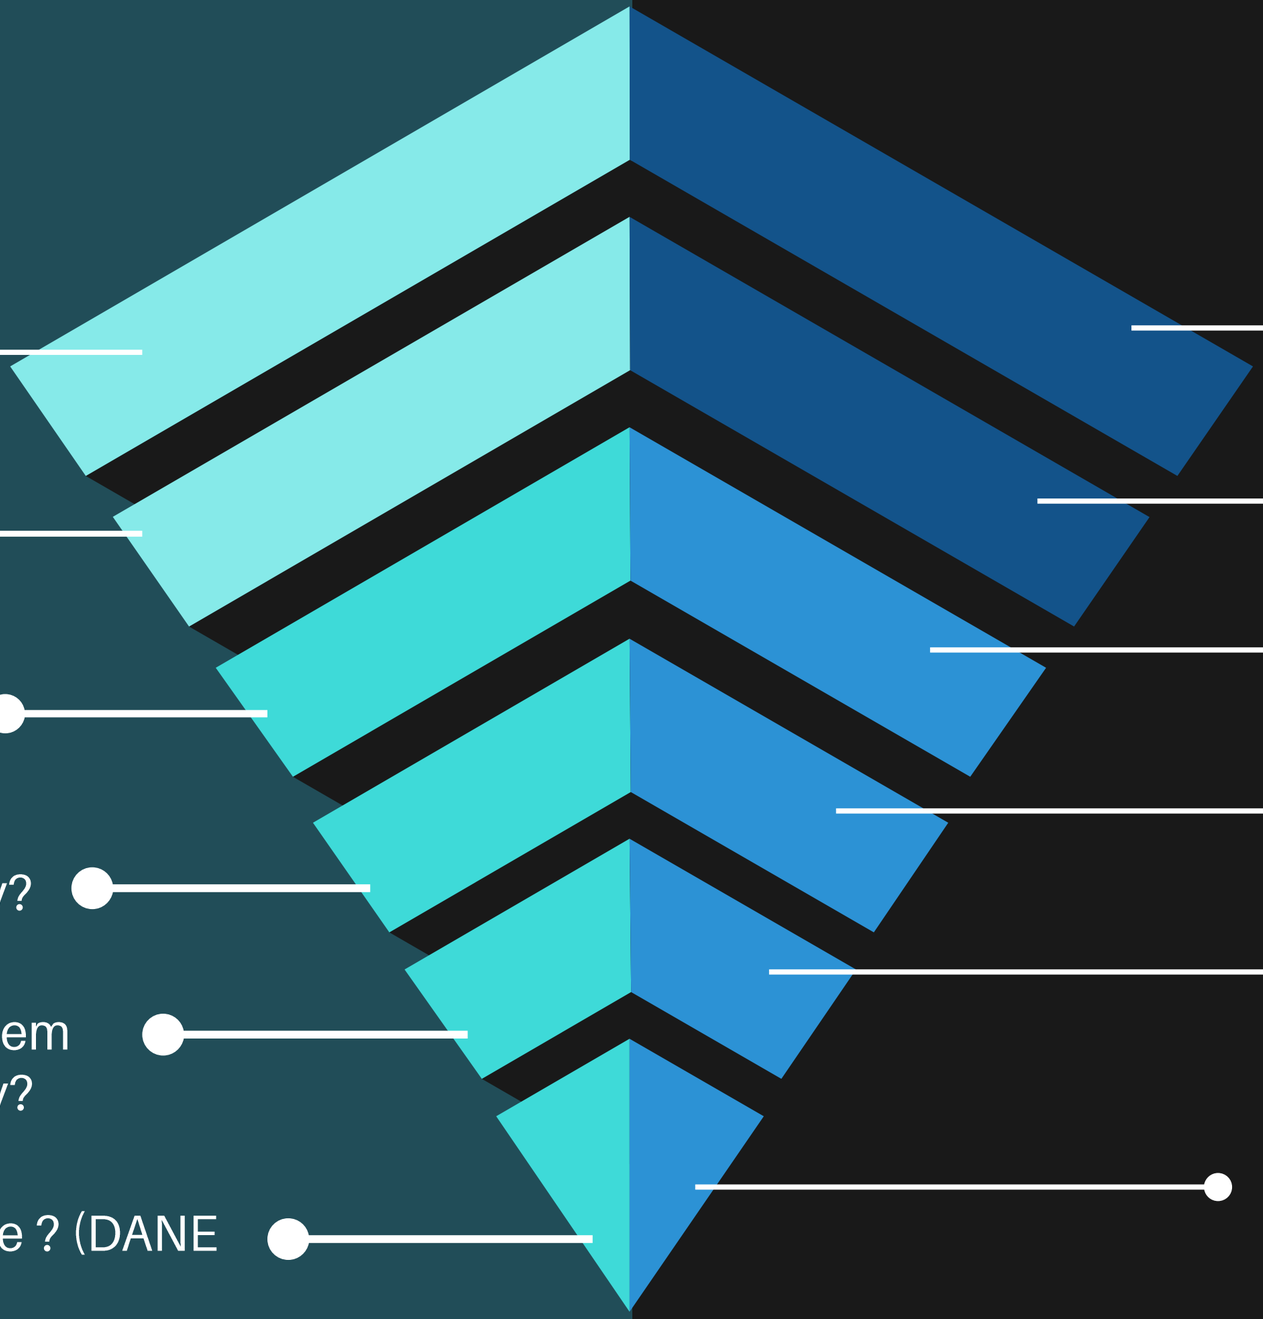

# ANALIZA

zasoby wlasne

ewentualni partnerzy

finansowanie

dokumenty strategiczne

doświadczenie realizatora

inne

# MA ZNACZENIE !!!!

"ŚWIEŻE" DANE RÓWNIEŻ !!!!

PROJEKTOWNIA

# GRUPA DOCELOWA

## kto jest odbiorcą naszego projektu

(uwzględniamy np. płeć, wiek, czy charakterystykę organizacji i osób zaangażowanych w jej działania),

## Jak liczna będzie grupa?

mierz siły na zamiary

## Sytuacja w społeczności

np. osoby pracujące, uczące się, mieszkańcy gminy,
dzieci, młodzież, mieszkańcy DPS

## Jakie trudności dotykają odbiorców?

finansowe; infrastrukturalne – np.:utrudniony dojazd, godziny pracy, nieprzystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych; itp...

PROJEKTOWNIA

# GRUPA DOCELOWA

## REKRUTACJA

JAKIMI KANAŁAMI DOTRZEMY DO POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW

ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

CO W PRZYPADKU GDY ZGŁOSI NAM SIĘ WIĘKSZA NIŻ PLANOWALIŚMY LICZBA OSÓB

# CEL

**S** PROSTY

**M** MIERZALNY

**A** AKCEPTOWALNY

**R** **REALNY**

**T** **OKREŚLONY W CZASIE**

# CEL

**A**

Realizacja wyjazdów usamodzielniających dla mieszkańców DPS

**B**

Zwiększenie samodzielności mieszkańców DPS

# CEL

**B**

Zwiększenie samodzielności 20 mieszkańców DPS poprzez zorganizowanie 3 wyjazdów usamodzielniających w okresie VI - VIII 2022 r.

# ZADANIA/ DZIAŁANIA

- Co będzie realizowane
- Kiedy będzie realizowane
- W jaki sposób działanie będzie realizowane
- Jaka kadra będzie zaangażowana
- Co jest nam niezbędnę

## ZADANIE

**REALIZACJA PROGRAMU "USAMODZIELNIAĆ NIE WIĄZAĆ POMOCĄ"**

## DZIAŁANIA

- UTWORZENIE PRACOWNI GOSPODARSTWA DOMOWEGO
- PRZEPROWADZENIE TRENINGÓW BUDŻETOWYCH
- PRZEPROWADZENIE TRENINGÓW KULINARNYCH
- ORGANIZACJA WYJAZDÓW USAMODZIELNIAJĄCYCH
- GRUPA WSPARCIA

# harmonogram

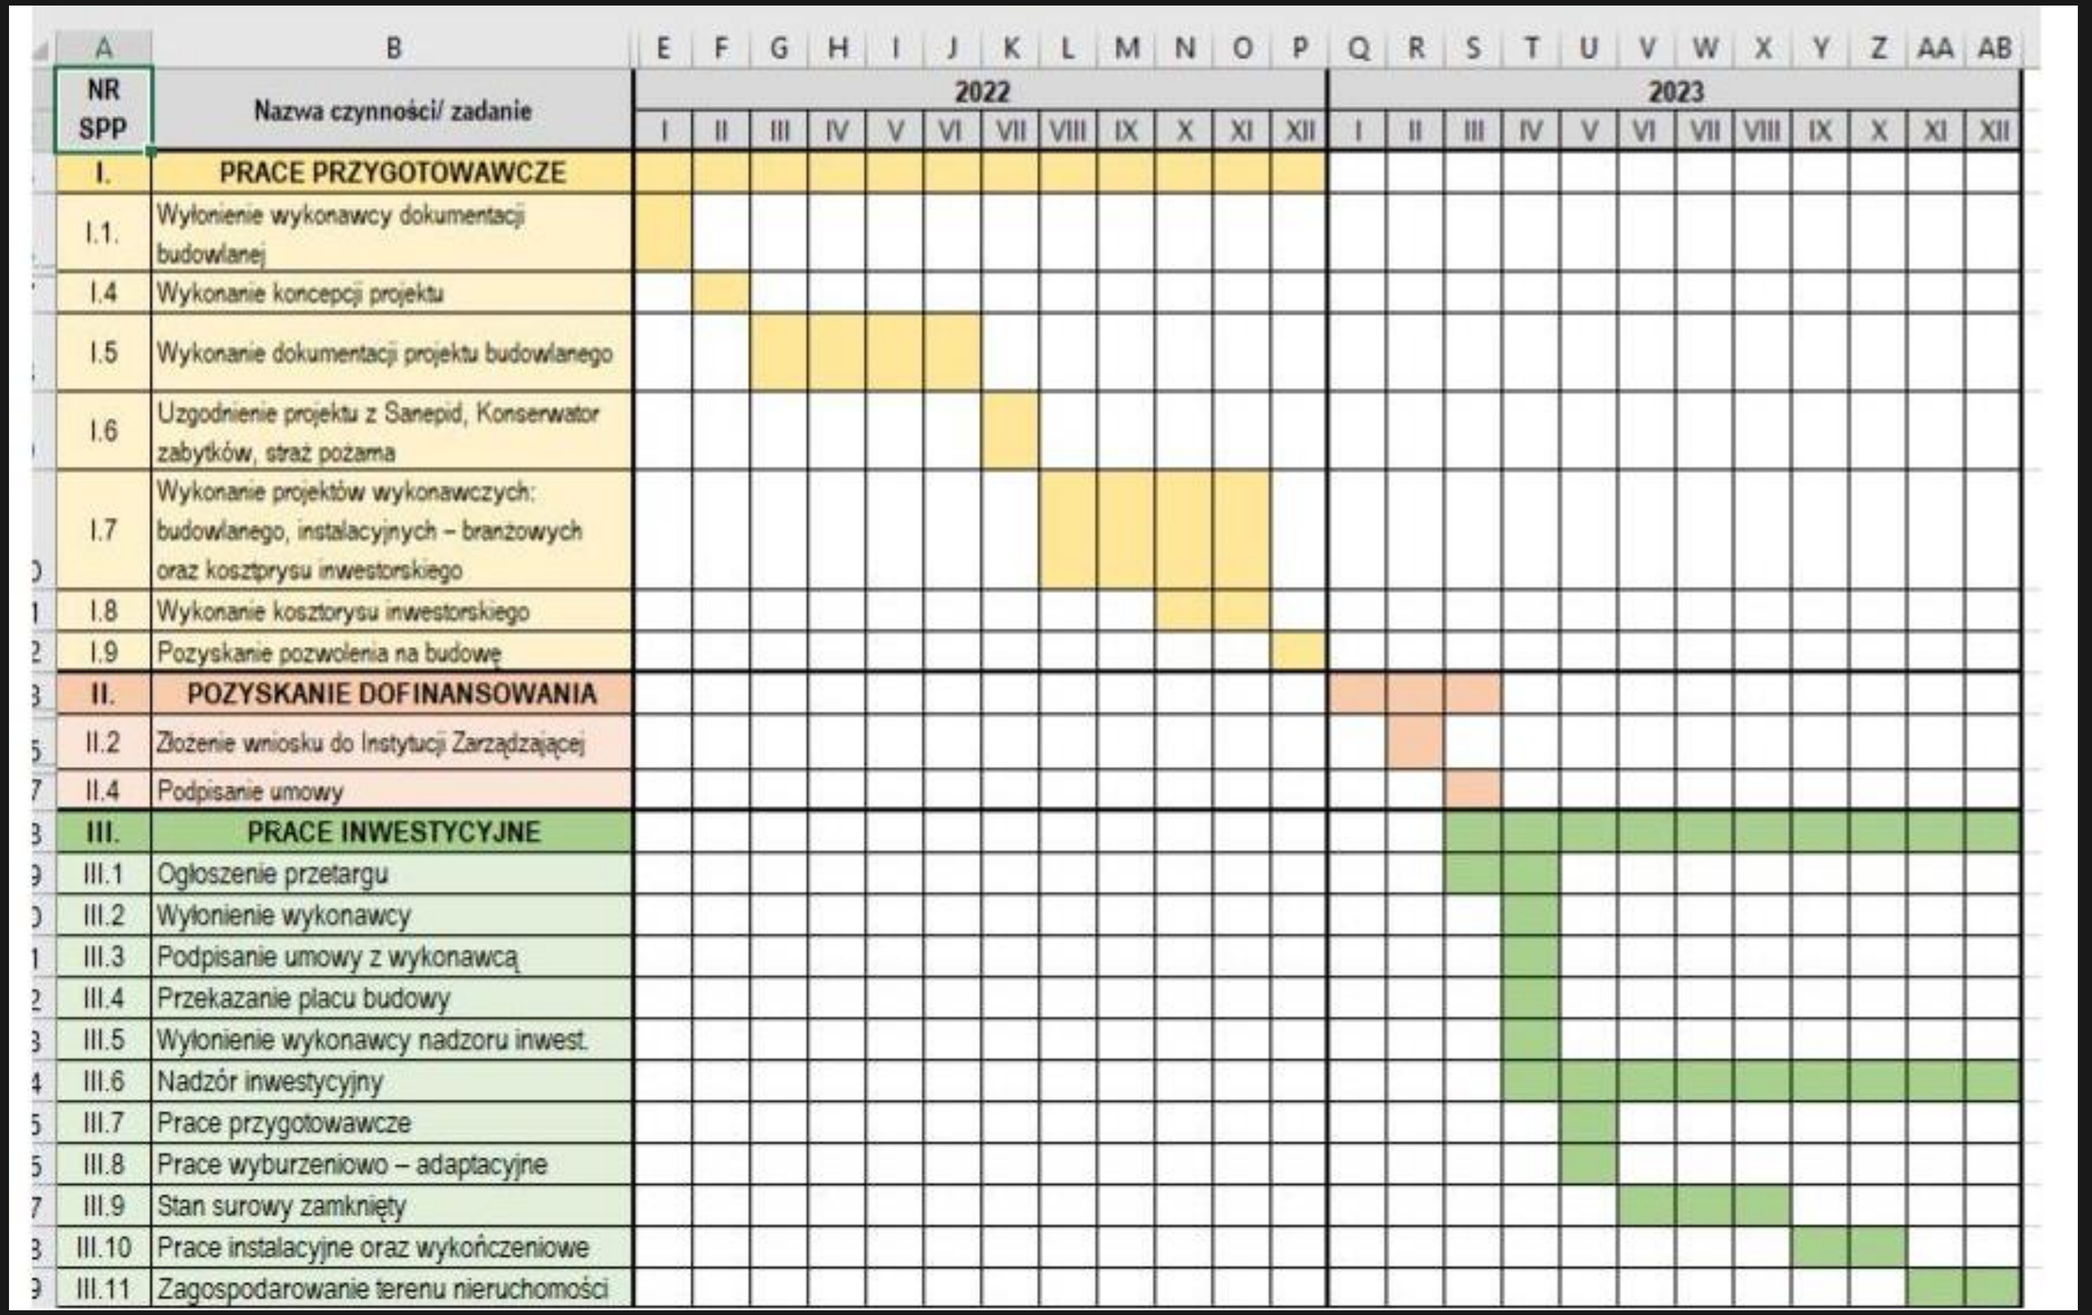

| NR SPP | Nazwa czynności/ zadanie | 2022 | | | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| I. | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.1. | Wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.4 | Wykonanie koncepcji projektu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.5 | Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.6 | Uzgodnienie projektu z Sanepid, Konserwator zabytków, straż pożarna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.7 | Wykonanie projektów wykonawczych: budowlanego, instalacyjnych – branżowych oraz kosztprysu inwestorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.8 | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.9 | Pozyskanie pozwolenia na budowę | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | POZYSKANIE DOFINANSOWANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.2 | Złożenie wniosku do Instytucji Zarządzającej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.4 | Podpisanie umowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. | PRACE INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.1 | Ogłoszenie przetargu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.2 | Wyłonienie wykonawcy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.3 | Podpisanie umowy z wykonawcą | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.4 | Przekazanie placu budowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.5 | Wyłonienie wykonawcy nadzoru inwest. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.6 | Nadzór inwestycyjny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.7 | Prace przygotowawcze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.8 | Prace wyburzeniowo – adaptacyjne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.9 | Stan surowy zamknięty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.10 | Prace instalacyjne oraz wykończeniowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.11 | Zagospodarowanie terenu nieruchomości | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BUDŻET

## budżet zadaniowy

- dobrze przemyślany i spójny (wewnętrznie i z harmonogramem),
- ukazujący pełny koszt przedsięwzięcia z naszym wkładem własnym
- szczegółowy, oparty o konkretne podstawy – realne koszty,
- proporcjonalny pomiędzy kosztami personelu i administracyjnymi, a kosztami związanymi bezpośrednio z projektem,
- planowane koszty powinny być uzasadnione i konieczne dla zrealizowania pomysłu.

PROJEKTOWNIA

KOSZTY KWALIFIKOWANE

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

KOSZTY POŚREDNIE

PROJEKTOWNIA

# KOSZT A WYDATEK

PROJEKTOWNIA

# CROSS - FINANCING

**to elastyczny sposób finansowania projektów, polegający na dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków z EFRR komplementarnych działań wchodzących w zakres EFS oraz dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków z EFS komplementarnych działań wchodzących w zakres EFRR.**

PROJEKTOWNIA

# WKŁAD WŁASNY

- OSOBOWY
- RZECZOWY
- FINANSOWY

PROJEKTOWNIA

# MONTAŻ FINANSOWY

Polega on na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu.

PROJEKTOWNIA

| | Nazwa czynności/ zadanie | j.m. | liczba | stawka jednostkowa | łącznie | opis wydatku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRACE PRZYGOTOWAWCZE | | | | | |
| WYD 1 | Wykonanie inwentaryzacji budowlanej | usługa | 1 | 50 000,00 | 50000,00 | Wydatek obejmuje koszt opracowania inwetaryzacji budowlanej (umowa cywilno - prawna). Cena oszacowana na podstawie rozeznania rynku - 3 egzemplarze |
| WYD 2 | Wykonanie koncepcji projektu | usługa | 1 | 30000,00 | 30000,00 | Wydatek obejmuje koszt opracowania koncepcji projektu budowlanego (umowa cywilno - prawna). Cena oszacowana na podstawie rozeznania rynku - 3 egzemplarze |
| WYD 3 | Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego | komplet | 1 | 300000,00 | 300000,00 | Wydatek obejmuje koszt opracowania projektu budowlanego - 3 egzemplarze (umowa cywilno prawna) |
| WYD 4 | Wykonanie projektów wykonawczych: budowlanego, instalacyjnych – branżowych oraz kosztorysu inwestorskiego | komplet | 1 | 600000,00 | 600000,00 | Wydatek obejmuje koszt wykonania projektów wykonawczych: budowlanego, instalacyjnych – branżowych oraz kosztorysu inwestorskiego - 3 egz. (umowa cywilno - prawna) |
| WYD 5 | Wykonanie kosztorysu inwestorskiego | komplet | 1 | 60000,00 | 60000,00 | Wydatek obejmuje koszt wykonania kosztorystu inwestorskiego - 3 egzemplarze ( umowa cywilno - prawna) |
| WYD 6 | Opłat związane z usykaniem pozowlenia na budowę | komplet | 1 | 5010,00 | 5010,00 | Wydatek obejmuje koszty związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę |
| | | | | **RAZEM ZADANIE 1** | **1045010,00** | |
